

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

17:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:40

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONAD	CANTIDAD	1	65000	65000.00	

SubTotal 65000.00

Descuento % 0

Total 65000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

ADMINISTRACION	65000
----------------	-------

Total 65000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

El equipo N.º 7 sí enfría correctamente. Al llegar, la velocidad del ventilador estaba en 60 y la temperatura en 25 °C; se configuró el equipo a 17 °C con el ventilador al máximo y funcionó sin inconvenientes. Se midió el gas refrigerante en la unidad exterior y los valores eran correctos.



El único inconveniente detectado fue que el equipo está a tierra: entre línea y neutro marca 220 V, y entre neutro y tierra 180 V. Para evitar daños en la placa electrónica, se bajaron las térmicas y se dejó el equipo fuera de uso hasta que se corrija la falla eléctrica.

Respecto al piso-techo N.º 8, ya se enviaron videos y fotos para gestionar su futuro reemplazo.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

No se hizo firmar la OT porque no había nadie a cargo.

IMAGENES

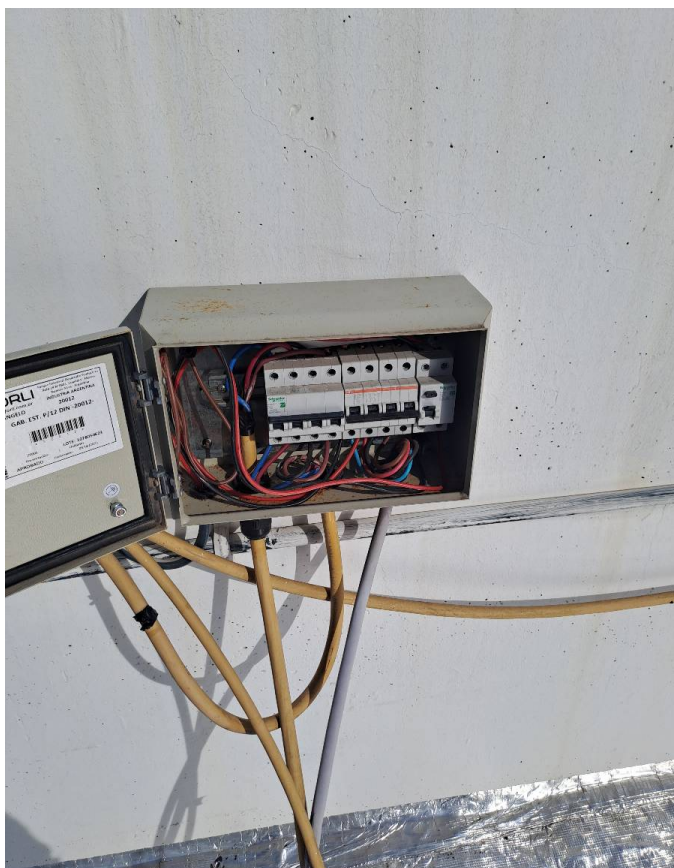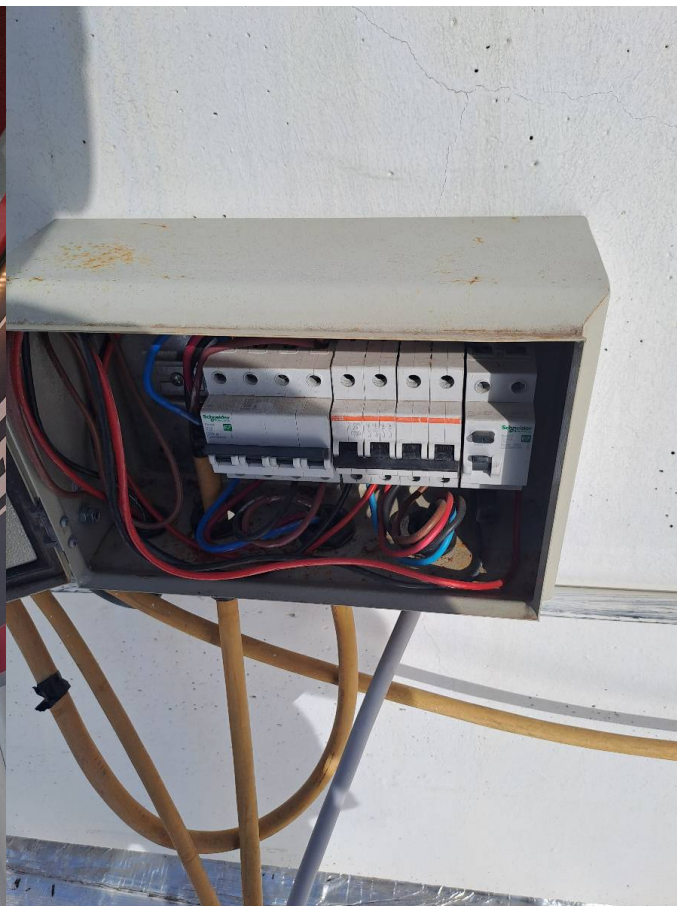



CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



CLIENTE

Martin villagra

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
