

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

11:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

14:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
MANO DE OBRA	CANTIDAD	1	75000	75000.00	Instalación bomba
VARIOS	CANTIDAD	1	180000	180000.00	Bomba

SubTotal 255000.00

Descuento % 00

Total 255000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
ADMINISTRACION	255000

Total 255000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza urgencia por equipo de aire acondicionado que presentaba pérdida de agua en el call de planta alta.

Al revisar el equipo, se detecta que la bomba de condensado no estaba activando, lo que provocaba el desborde de agua. Se informa la situación y se acuerda la instalación de una bomba de mayor capacidad.

Se procede a la compra del nuevo equipo y, una vez disponible, se realiza el reemplazo de la bomba existente.

Se instala la nueva bomba de condensado, se realizan las conexiones correspondientes y se prueba el funcionamiento, verificando que el equipo opere correctamente sin pérdidas.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS


Se reemplaza la bomba completa junto con su manguera, instalando todos los componentes nuevos. Además, se sella correctamente el paso de cañerías para evitar filtraciones de agua.

IMAGENES







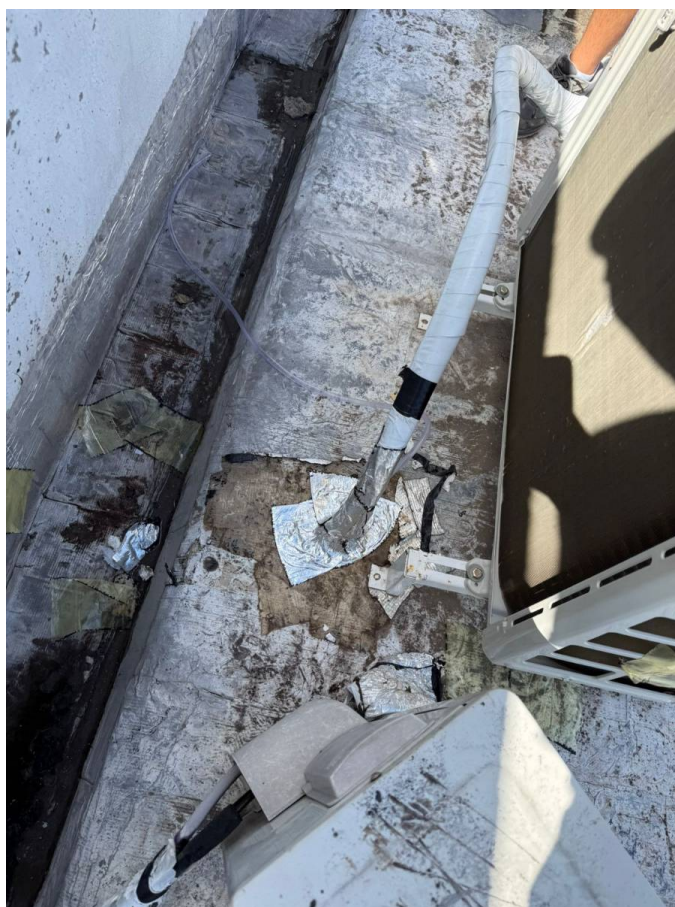

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Fabián charras

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
