

Hora comienzo

Seleccione el horario

09:00

Hora finalización

Seleccione el horario

14:00

Detalles equipo

Tomar el N° de serie de los equipos

N° de serie UI	N° de serie UE	Marca	Capacidad

Detalles y costos del trabajo

Materiales e insumos

Los precios especificados a continuación NO incluyen IVA

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE DE MANTENIMIENTO PISO/TECHO	CANTIDAD	1	285000	285000.00	

SubTotal 285000.00

Descuento % 0

Total 285000.00

Formas de pago

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto \$
SISTEMA	285000

Total 285000.00

Checklist

Marcar lo realizado

- Se reviso que el equipo funcione correctamente antes de realizar el service

- Se revisaron presiones y consumo antes de realizar el service
- Se desmontan carcasas plásticas en unidad interior
- Se protege placa de unidad interior
- Se utilizo film covertor para proteger el área de trabajo
- Se realiza sanitizado completo (Serpentina, turbina y bandeja de desagües)
- Al armar la unidad interior nuevamente, se prueba el desagüe
- Se realiza sanitizado completo de unidad exterior
- No se realiza sanitizado completo a unidad exterior (Detallar motivo)
- Se mide presión y consumo posterior al servicio de sanitizado
- Se realiza control del funcionamiento completo del equipo
- El equipo quedo limpio, sin huellas ni manchas
- Se limpia el lugar donde se trabajo sin dejar residuos
- Se verificó el checklist con el cliente
- OT no tiene firma del cliente por ausentarse

Detalles

Observaciones

Se realiza servicio de mantenimiento a A/A N° 39.

Incluye:


- Limpieza completa de unidad interior, limpieza de turbina, limpieza de bandeja de condensado y limpieza de serpentina. Se controla gas refrigerante y consumo.
- Limpieza de filtro de aire, serpentina y turbina.
- Limpieza externa de evaporador y condensador.
- Control de consumo y lubricación de motores eléctricos, componentes de seguridad y placas interna y externa.
- Verificación de presiones de trabajo de alta y baja.
- Verificación del correcto drenaje, incluyendo limpieza de bandeja.
- Control de presión de gas refrigerante y de funcionamiento.

Fotos

Campo Fotos

Agregue las fotos que considere



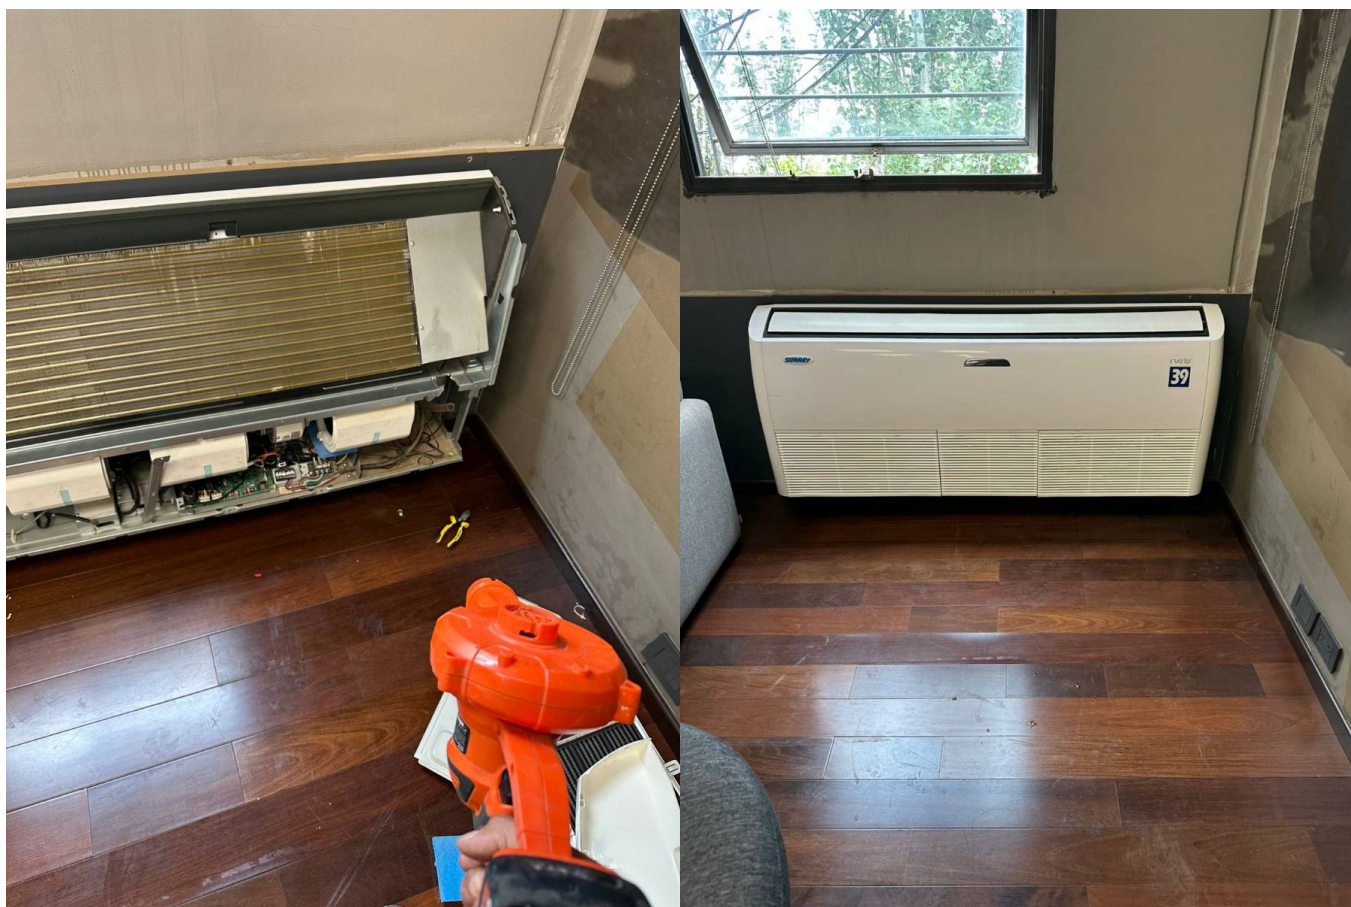



Conformidad del cliente

Firmas Digitales

El cliente está satisfecho con el trabajo realizado y el técnico finalizo el trabajo en el domicilio

Firma del cliente

Fabián charras

Firma del técnico

MIDEA / SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
