

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:40

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:20

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
INSTALACIÓN PISO/TECH	CANTIDAD	1	500000	500000.00	
KIT POR METRO PISO/TECHO 5/8 - 3/8	Metros	6	53000	318000.00	
CABALLETE 500	CANTIDAD	1	50000	50000.00	
DESAGÜES Y MATERIALES P/ DESAGOTE DE AIRE ACONDICIONAD	Metros	3	3000	9000.00	
VARIOS	CANTIDAD	1	0	0.00	sellado de techo con membrana
DESMONTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	CANTIDAD	1	75000	75000.00	Ig de 18000 frig dado de baja

SubTotal 952000.00

Descuento % 0

Total 952000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
SISTEMA	952000

Total 952000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES



Se desmonta un equipo de aire acondicionado LG de 18.000 frigorías R410 y en su lugar se instala un Surrey de 18.000 frigorías con gas R32. Dado que la cañería existente no era compatible con el nuevo equipo, se colocaron 6 metros de cañería nueva junto con su desagüe.



Se realizó vacío en la instalación, prueba de estanqueidad y conexión trifásica, dejando el equipo en marcha. El hueco en el techo se selló con sellador para zinguería reforzado y, por encima, membrana para techo. El equipo exterior quedó montado sobre caballetes apoyados en tacos de goma antivibratorios.

Se probó en modo frío y el desagüe, funcionando todo correctamente. El equipo retirado quedó en la misma instalación de Toyota.


OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES

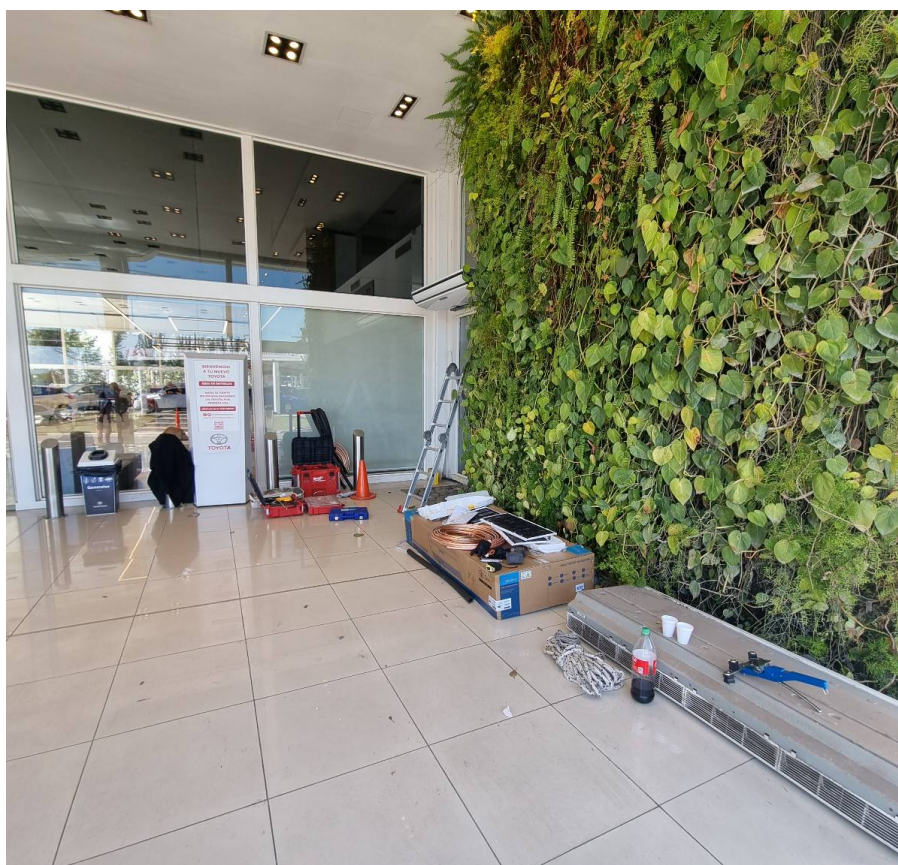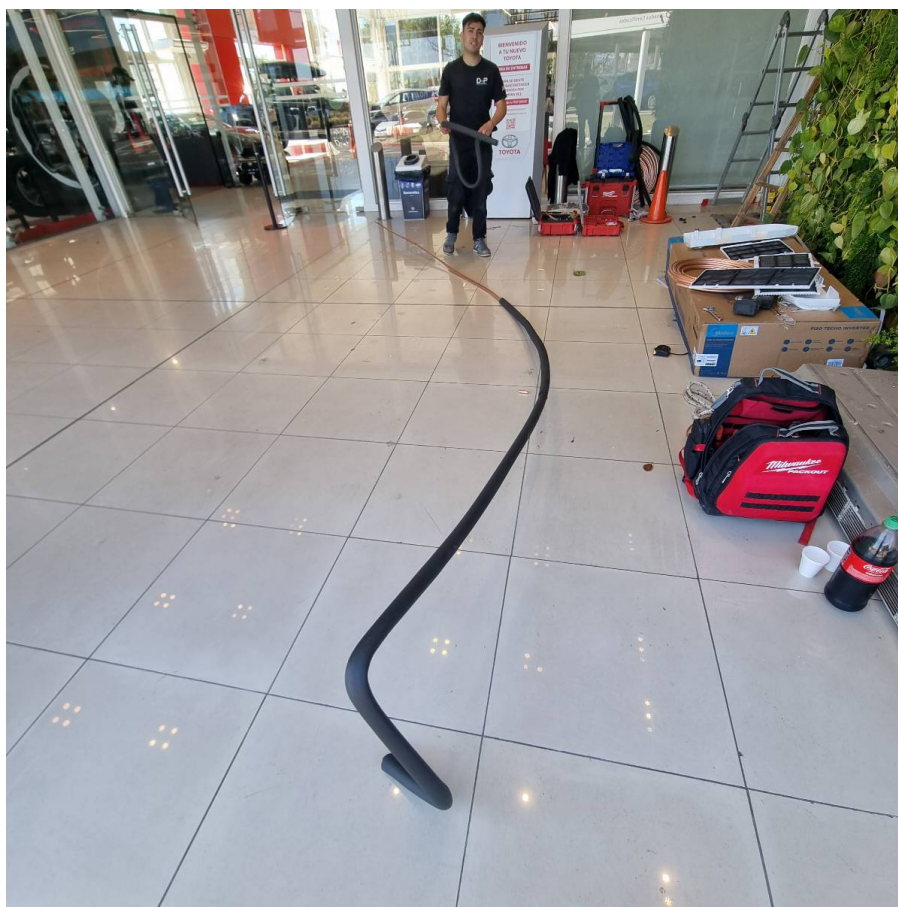

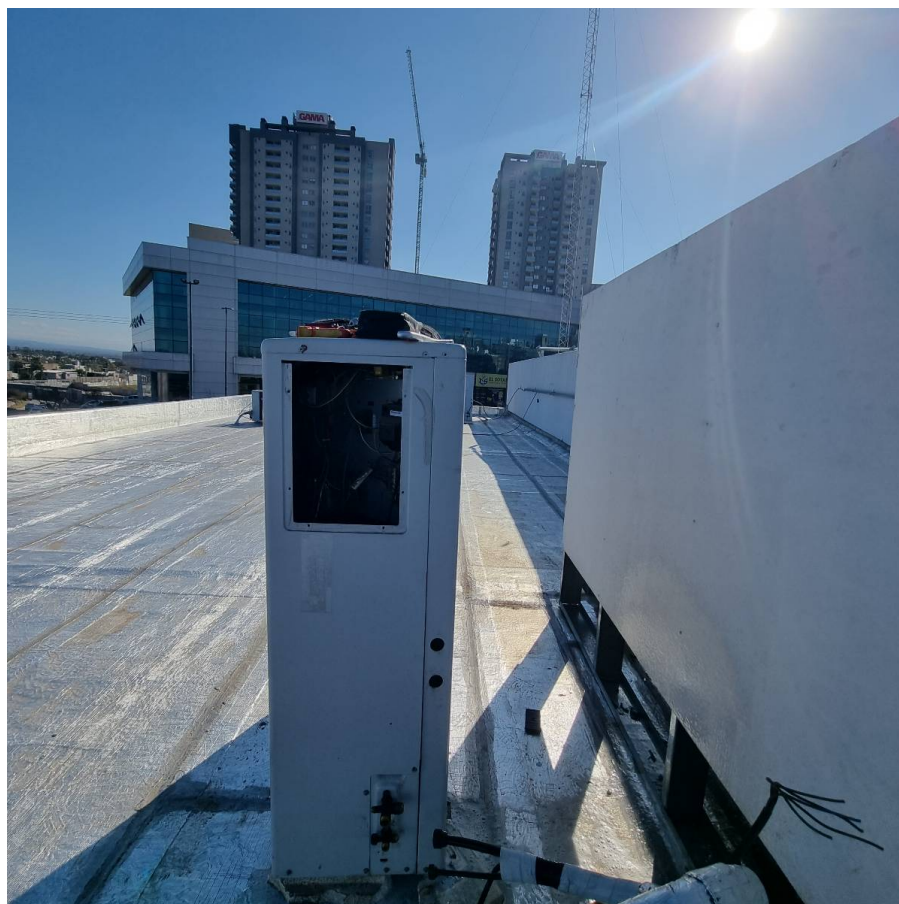



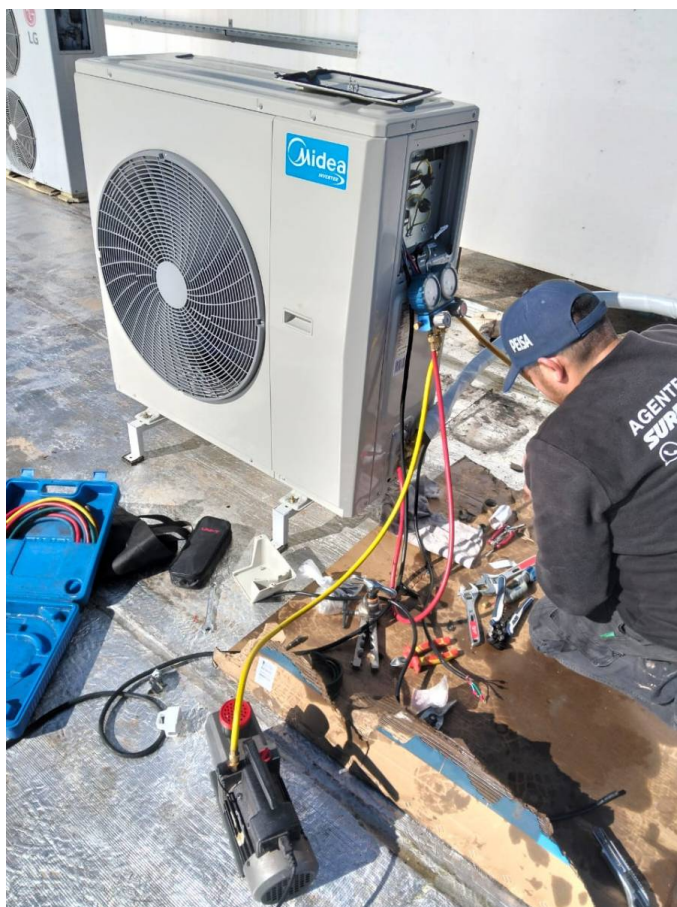



CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

lucas muñoz

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
